


(건설과)

조직 및 인력현황

□ 조 직(4팀)

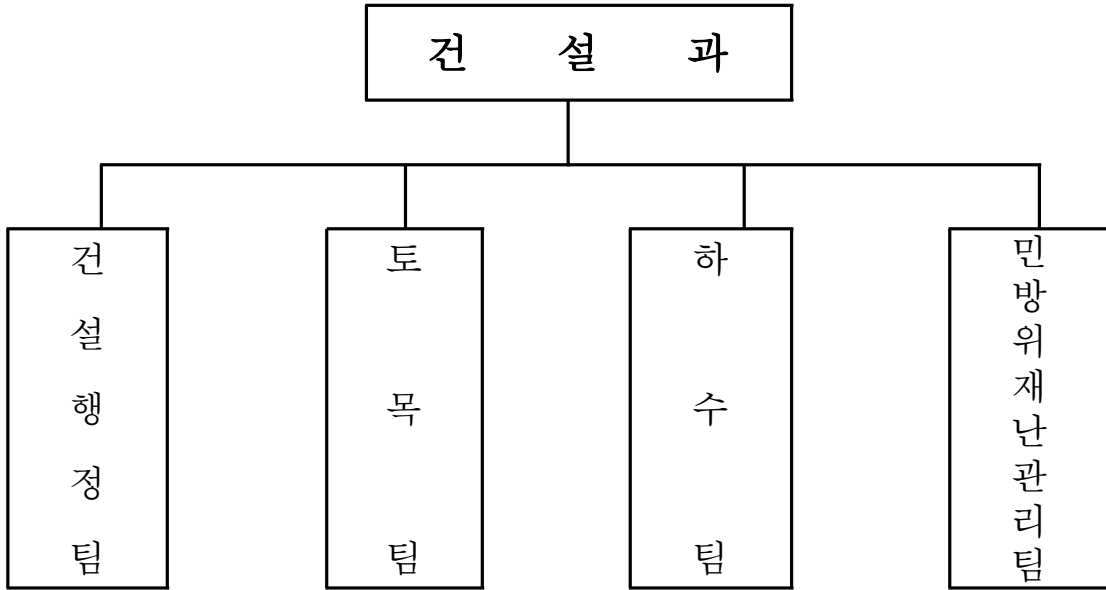

□ 인 원(21/20)

(정원 / 현원)

구 분	계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기능직
계	21/20		1/1	4/4	6/5	5/5	2/2	3/3
건설행정팀	5/5		1/1	1/1	2/1	1/2		
토목팀	7/7			1/1	2/2	1/1	1/1	2/2
하수팀	5/5			1/1	1/1	2/2	1/1	
민방위재난관리팀	4/3			1/1	1/1	1/0		1/1

쾌적하고 안전한 도로관리

□ 사업개요

- 사업명 : 도로유지관리 및 소규모 주민편익사업
- 사업비 : 20억원
 - 도로유지관리 7억원, 주민편익사업 6억원
 - 경인로 노면정비공사 4억원
 - 보도정비공사 3억원
- 사업기간 : 2009. 2 ~ 11월

□ 추진실적

- 도로유지관리사업 ———— 8건/98개소
 - 도로포장 정비(25개소) : L=4,109m(A=257.36a)
 - 보도정비(6개소) : L=919m(A=5,075m²)
 - 도로부속시설물 보수 : 67개소
- 소규모 주민편익사업 ———— 8건/89개소
 - 도로포장 정비(18개소) : L=4,804m(A=311.94a)
 - 보도정비 및 신설(8개소) : L=457m(A=1,119m²)
 - 도로부속시설물 보수 : 63개소
- 경인로 노면정비 ———— 237.02a
- 가로등·보안등 정비 ———— 1,632개(가로등 859, 보안등 773)

□ 추진성과

- 도로 및 도로부속시설물의 적기 보수로 쾌적하고 안전한 도로여건 조성
- 시민중심의 주민편익사업 시행으로 삶의 질 향상과 시민 만족도 제고

하우고개로 확장 및 보도설치

□ 사업개요

- 위 치 : 소사구 심곡본동 562-441번지 ~ 시흥시계
- 사 업 량 : L=640m, B=6m→10m(보도폭원 2.3m)
- 사 업 비 : 36억 8,000만원(보상비 16억, 시설비 20억, 감리비 8,000만)
- 사업기간 : 2009. 4. 21. ~ 2010. 4. 16.

□ 추진실적 및 계획

- 도시계획사업 실시계획(변경)인가 _____ 2006. 12월
- 사업비 확보 _____ 36억8,000만원
 - ▣ 국비 : 5억, 도비 : 16억, 시비 : 15억 8,000
- 편입지 토지보상 _____ 2007. 12 ~ 2008. 12월
- 교통소통대책 수립 및 심의 완료 _____ 2008. 10월
- 시흥시 협의 _____ 4회('07. 2, '08. 6, '08. 12, '09. 9)
- 공사발주 _____ 2009. 3. 31.
- 공사착공 _____ 2009. 4. 21.
- 공사준공 _____ 2010. 4. 16.
 - ▣ 2009. 10월말 현재 공정률 50%

□ 추진성과

- 지역간 연계도로의 확장으로 차량흐름 원활 및 교통사고 위험해소
- 보도설치로 성주산 등산객에게 안전한 보행공간 제공

도시계획도로 개설을 위한 실시설계

□ 사업개요

- 위치 : 범박동 산29-1, 옥길동 635-1, 옥길동 644-1번지 일원
- 사업량 : L=1,382m, B=6~10m
 - 소로 1-230호선(범박동 산29-1) : L=700m, B=10m
 - 소로 3-702호선(옥길동 635-1) : L=605m, B=6m
 - 소로 3-703호선(옥길동 644-1) : L=134m, B=6m
- 사업비 : 1억 700만원(실시설계비)
 - 소로 1-230호선 : 6,200만원
 - 소로 3-702호선 : 3,300만원
 - 소로 3-703호선 : 1,200만원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 2011. 11월

□ 추진실적

- 실시설계 용역 착수 _____ 2009. 1. 30.
- 실시설계 용역 중간보고 _____ 2009. 5. 27.
- 실시설계 용역 주민설명회 _____ 2009. 6. 10.
- 실시설계 용역 준공 _____ 2009. 6. 28.
- 부천옥길 보금자리주택지구지정을 위한 의견청취 공람공고 _____ 2009. 10. 20.

▣ 부천옥길 보금자리주택지구내에 포함되어 있어 지구지정결정시 사업취소 예정

□ 추진성과

- 노폭협소 및 선형이 불량한 도로(농로) 확장으로 시민편익 증대
- 가로망 연계성 확보로 지역간 균형발전 및 원활한 교통소통 도모
- 사유지 도로사용에 따른 민원해소 및 주민숙원사업 해결

쾌적한 도시환경 조성을 위한 하수도 정비

□ 사업개요

○ 사업량 : 하수관 확장 및 정비공사 13건, 하수도 준설공사 2건

총연장 7.3km(하수관로 정비 1.1km, 하수도준설 6.2km)

○ 사업기간 : 2009. 1 ~ 11월

○ 사업비 : 8억원

- 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 5억원
- 관내 일원 하수도 준설공사 1억 5,000만원
- 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 1억 5,000만원

□ 추진실적

- | | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| ○ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 | ————— | 9건/173개소(777m) |
| ○ 관내일원 하수도 준설공사 | ————— | 2건/6,210m |
| ○ 하수도 확장 및 불량하수관 정비공사 | ————— | 2건/338m |

□ 추진성과

- 불량 하수시설물에 대한 적정 유지관리로 원활한 배수 기능 확보
- 주민불편사항 신속 처리로 신뢰받는 행정 구현

하수암거 적기보수로 구조물 안전성 확보

□ 사업개요

- 사업명 : 송내 및 심곡지구 하수암거 보수공사
- 위치 : 송내2동 및 심곡본동 일원
- 사업량 : 하수암거 보수공사 L= 2,393m
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 9월
- 사업비 : 7억원

▣ 관내 노후 하수암거 정밀점검 및 실시설계용역 5,000만원(L=12.7km)

□ 추진실적

- 실시설계용역 착공 _____ 2009. 2. 2.
- 실시설계용역 준공 _____ 2009. 5. 2.
- 공사착공 _____ 2009. 6. 11.
- 공사준공 _____ 2009. 9. 25.

□ 추진성과

- 노후된 하수암거 시설물의 적기 유지 보수로 재난·재해 예방 및 쾌적한 주거환경 조성

특 수 시 책

에너지 절감을 위한 가로등 조명시설 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 심곡본동 666-3번지 일원(심곡공원로) 외 2개소
- 사 업 량 : 가로등 99등
 - 심곡공원로(경인로~복숭아로) : 30등(나트륨램프 250W→ LED램프 52W)
 - 옥련로(서울시계~광명시계) : 47등(나트륨램프 250W→ LED램프 72W)
 - 소명지하차도 상부 : 22등(나트륨램프 250W → LED램프 72W)
- 사 업 비 : 7,700만원
- 사업기간 : 2009. 1. 29 ~ 3. 29

□ 추진실적

- 공사착공 _____ 2009. 1. 29.
- 공사준공 _____ 2009. 3. 29.
- 전력소모량 및 전기요금 절감 분석 _____ 2009. 12월
- 한국전력공사 계약전력 변경 _____ 2010. 2월

□ 추진성과

- 공공시설물 고효율 조명설비 개선으로 전기요금 절감(600만원/연)
- 심곡공원로 주택지 가로등 불빛으로 인한 수면방해 민원해결

불량 하수맨홀 정비 및 인상 추진

□ 사업개요

- 사업명 : 불량 하수맨홀 인상 및 보수공사
- 사업량 : 불량 하수맨홀 인상 100개소
- 사업기간 : 2009. 5. 18 ~ 6. 8
- 사업비 : 5,274만원

□ 추진실적

- 현장조사 및 실시설계 _____ 2009. 1 ~ 4월
- 공사착공 _____ 2009. 5. 18.
- 공사준공 _____ 2009. 6. 8.

□ 추진성과

- 기존 불량맨홀의 일제정비로 재해 사전 예방
- 불량맨홀 적기 보수를 통한 차량주행성 개선 및 주민 불편해소
